



Надзор и еколошки мониторинг над хидротехничким и багерским радовима на критичним секторима на реци Дунав

ТРЕЋИ САСТАНАК ФОРУМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА – 21. септембар 2018.

Република Србија
Министарство
грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре






**□ Хидротехнички и багерски
радови према Програму радова**



ПЛАН И ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РАДОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА



ЗАХТЕВИ ИНЖЕЊЕРА

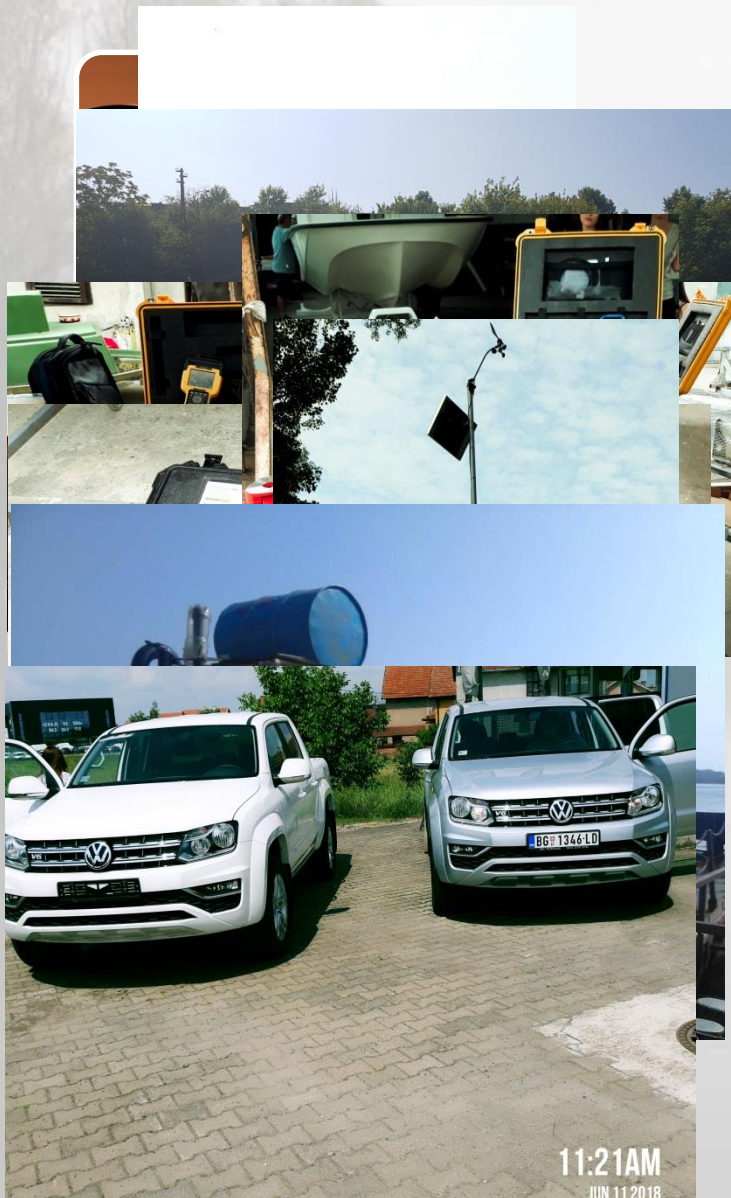

1) Главна канцеларија

2) Канцеларија „на води“

3) Брод

4) Опрема за хидрографска мерења

5) ADCP опрема

6) Геодетска опрема

7) Инсталација 6 водомерних станица

7) Инсталација IP камера

8) Превоз на терену

Материјали

- Геотекстил
- Камен
- Лабораторија
- Место утовара / истовара

Механизација и запослени

- Постављање опреме за геотекстил
- Сенкер
- Механизација за постављање камена
- Тегљач
- Инжењери и радници
- Брод за мерење

Мерење

- Калибрација опреме
- Мерење



ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Бр.	Назив критичног сектора	Врста радова	Стационажа од	до
18	Сусек	Багерски радови А	1285+000	1283+950
		Багерски радови В	1282+650	1282+050
19	<u>Futog</u>			1265+000
		<u>Detached groyne</u>	1263+350	
21	Аранкина ада	Багерски радови	1246+600	1245+300
22	Чортановци	Багерски радови	1240+300	1239+350
		Праг бр. 1	1237+700	
		Праг бр. 2	1237+150	
		Праг бр. 3а	1236+150	
		Праг бр. 3б	1236+000	
23	Бешка	Багерски радови	1229+600	1227+400
24	Прелив	Шеврон бр. 1	1200+600	
		Шеврон бр. 2	1199+800	



Тестирање
за камен
величине 6-
15 cm


Батиметријско
мерење –
структура 19.1
/ 19.2


Тестирање
за геотекстил


Изјава о
методи

Одобрења
од стране
Инжењера

ОБАВЕШТЕЊЕ О
ОДОБРЕЊУ
ПОЧЕТКА РАДОВА
(21. АВГУСТ 2018) –
СЕКТОР ФУТОГ

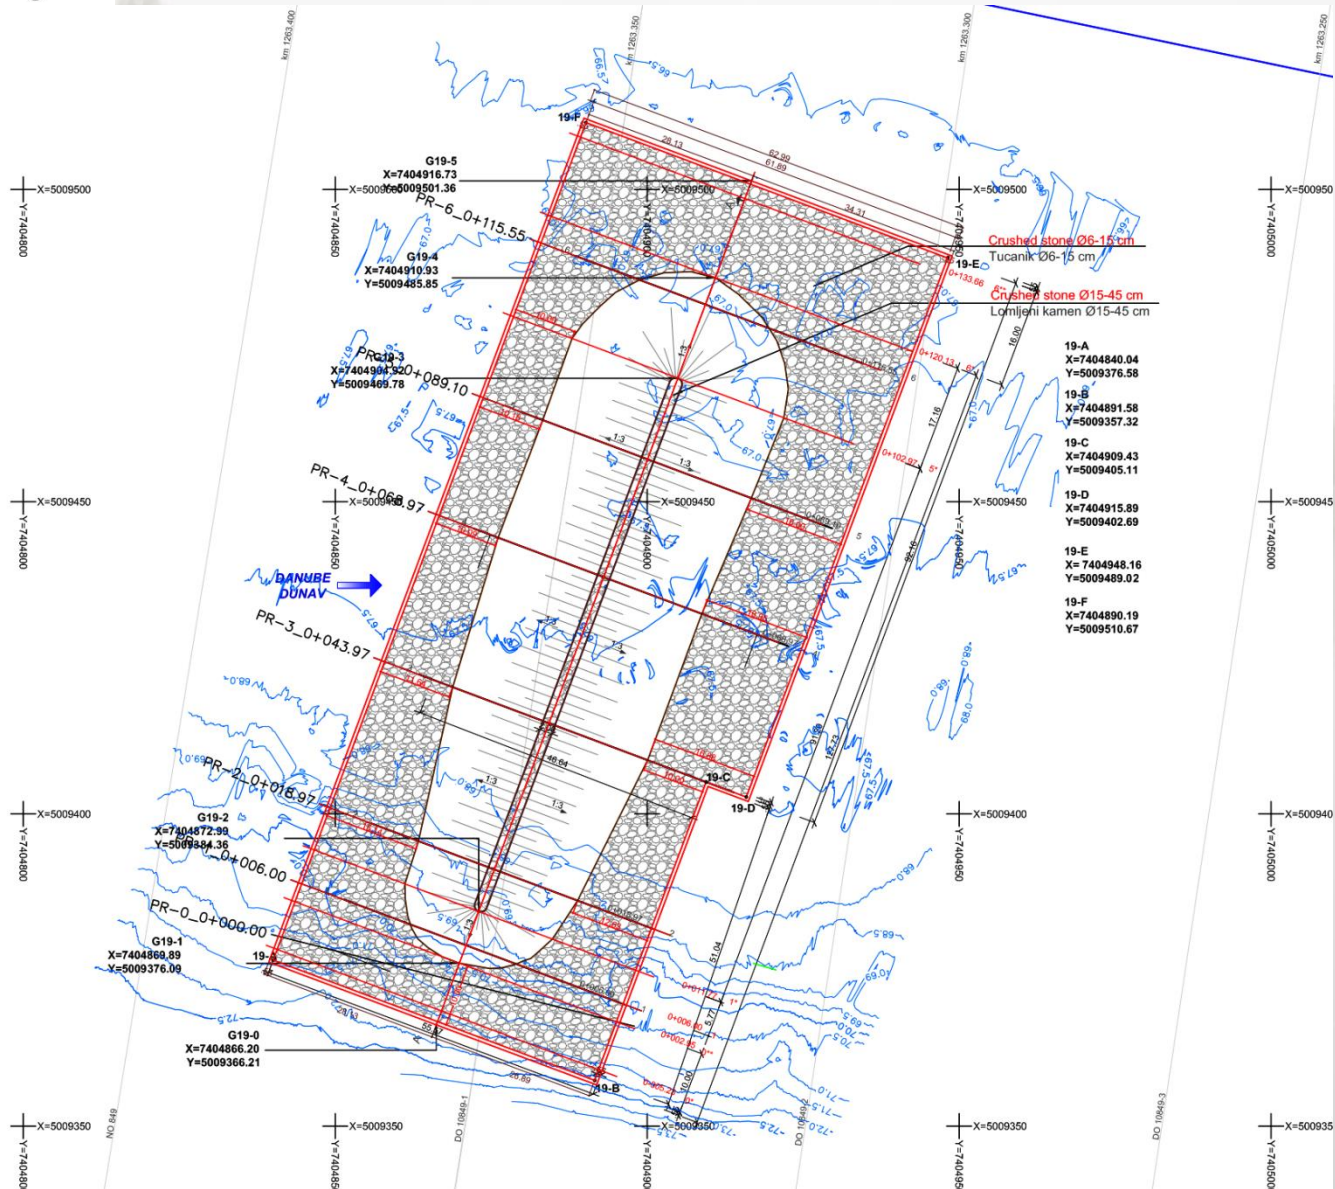

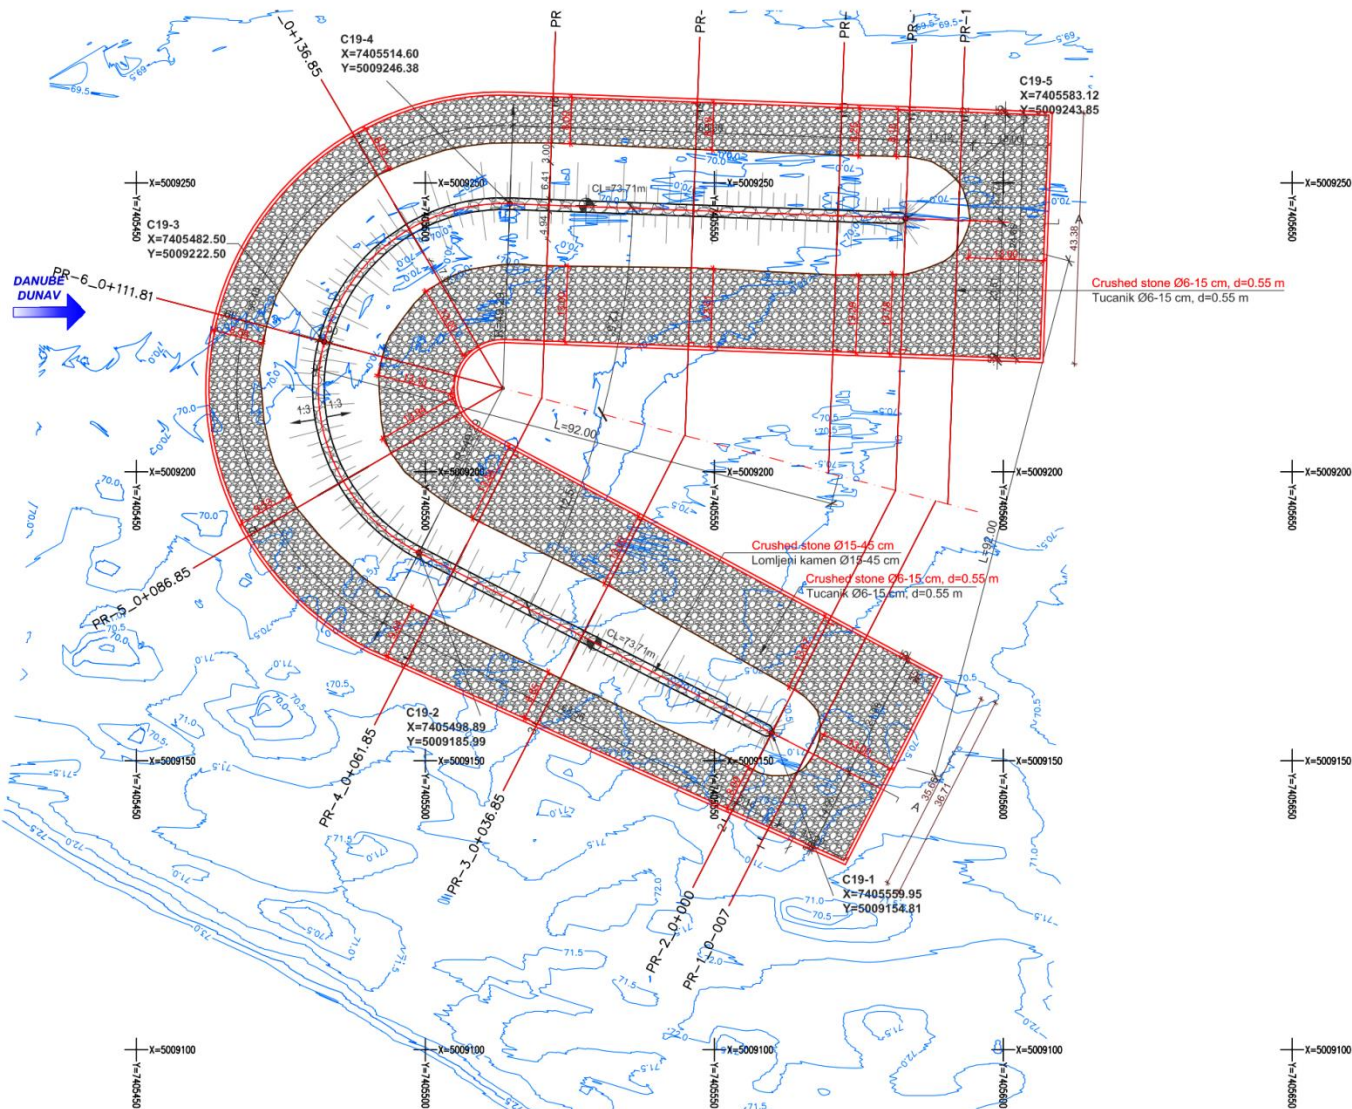

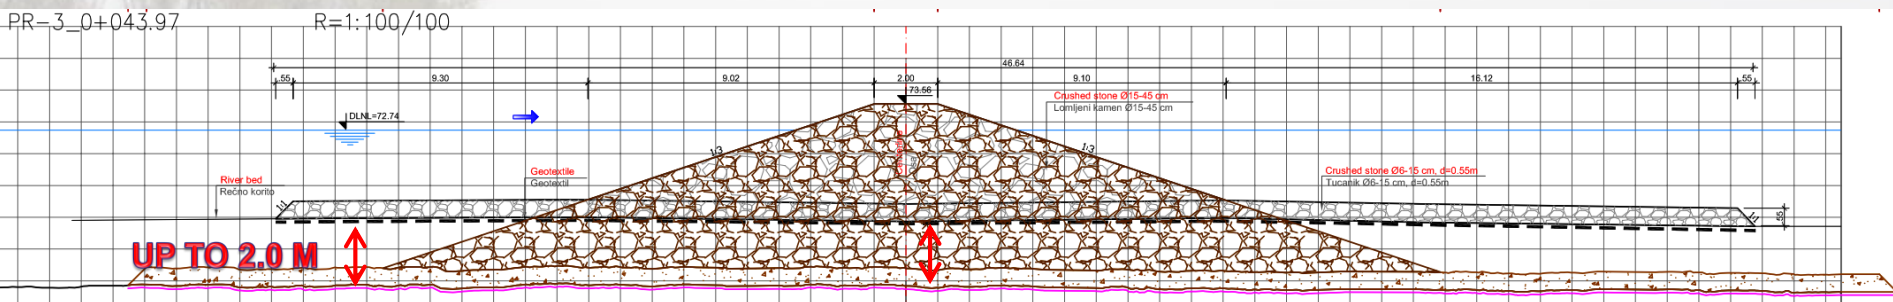

Материјали		Јединица мере	Количина-19.1 (израчунато у Коначном нацрту)	Количина-19.1 (израчуната по новом мерењу)
Геотекстил		m ²	5.632,00	7.785,00
Основни слој (6/15 cm)		m ³	3.098,00	4.237,00
Тело грађевине (15/45 cm)		m ³	4.732,00	8.786,00

Чишћење
речног
корита



Полагање
геотекстила





Постављање
камена на
геотекстил



Ста вка	Активност	Планиран датум	Датум почетка
1	Пријем и предаја свих захтева Инжењера	02.07.2018	Извршено у планирано време
2	Почетак грађевинских радова на првој грађевини (неукорењени напер 19.1)	16.07.2018	21.08.2018
3	Почетак грађевинских радова на грађевини (шеврон 24.1)	05.08.2018	Није започето

Бр.	Опрема	Количина
1	Опрема за полагање геотекстила-ваљак	1
2	Механизација за постављање камена са интегрисаним багером	1
3	Тегљач	1
4	Сенкер	1
5	Транспортациона баржа	1

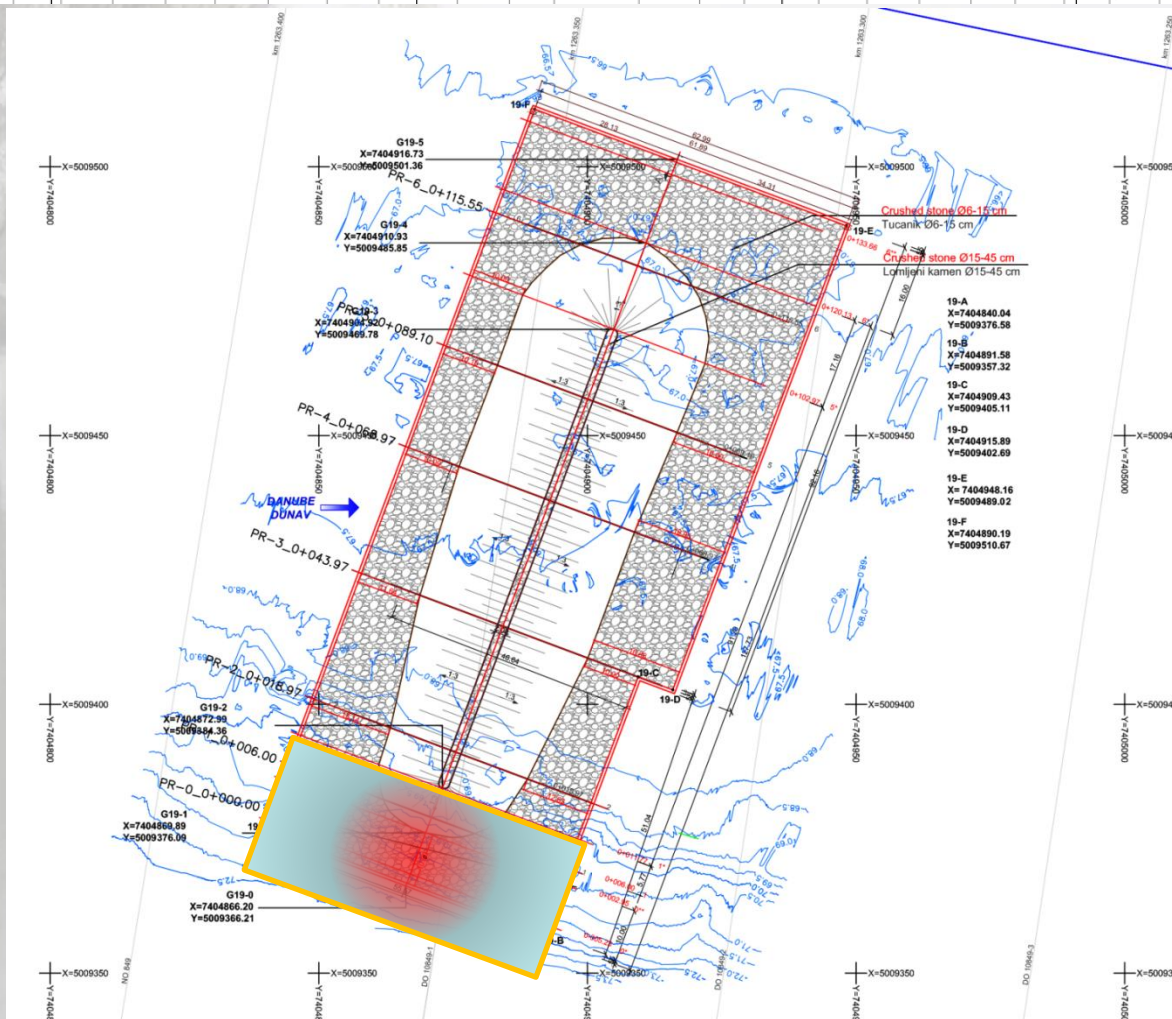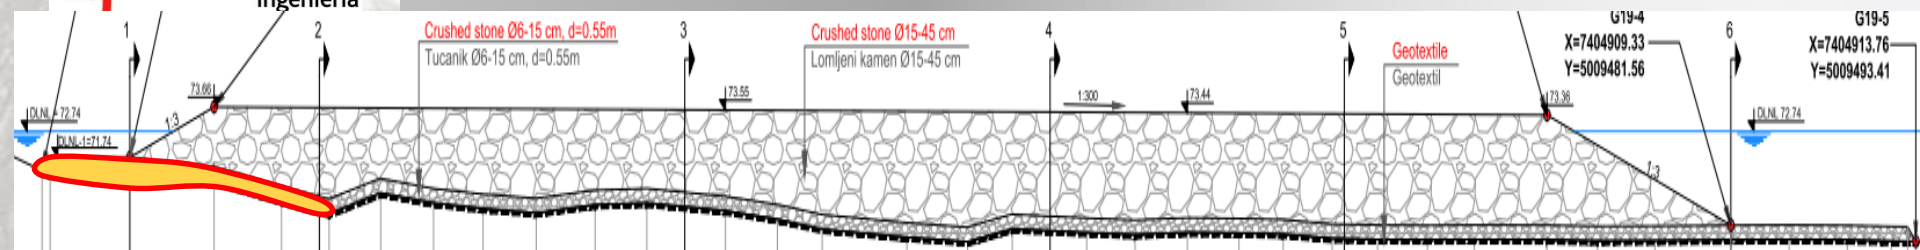

Хвала на пажњи

